LAB 5

Họ và tên: Nguyễn Minh Hiển MSSV: 1913386

Câu 1: Thiết lập mẫu báo cáo liên quan đến dự án như về chi phí dự án, sử dụng tài nguyên dự án, công việc dự án. * Báo cáo chi phí dự án

Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm gia sư	9/25/22	10/2/22	10/9/22	10/16/22	10/23/22	10/30/22
Khảo sát dư án						
Khảo sát các nghiệp vụ	\$480.00	\$480.00				
Khảo sát các chức năng của hệ thống	\$460.00	\$720.00	\$240.00			
NOTES IN THE PROPERTY OF THE P		100.000.000.000	\$240.00			
Khảo sát các ràng buộc của hệ thống		\$240.00	#0C0.00			
Khảo sát giao diện cơ bản của hệ thống			\$960.00			
Phân tích hệ thống						
Xác định yêu cầu của hệ thống						
Các chức năng chính-phụ				\$640.00		
Đảm bảo tốc độ xử lý và nâng cấp trong tương lai				\$480.00		
Phân tích và đặt tả mô hình phân cấp chức năng tổng thể			\$640.00			
Phân tích bảng dữ liệu				\$960.00		
Thiết kế						
Thiết kế tổng thể			_	\$240.00	\$960.00	
Thiết kế chi tiết						
Thiết kế cơ sở dữ liệu				\$240.00	\$1,200.00	
Thiết kế giao diện người dùng				\$800.00	\$800.00	
Thiết kế các chức năng đảm bảo tính logic cho hệ thống				\$720.00	\$1,200.00	
Hiện thực						
Hiện thực cơ sở dữ liệu						
Xây dựng server						
Hiện thực phần giao diện frontend	6					
Hiện thực phần backend						
Kiểm thử						
Thiết kế các test scenario, các testcase						
Thực hiện kiểm thử						
Sửa lỗi						
Triển khai và bảo trì						

	Cash Flow as of Sat 1: Project1	2/10/22				
	9/25/22	10/2/22	10/9/22	10/16/22	10/23/22	10/30/22
Cài đặt hệ thống						
Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng					-	
Sửa lỗi khi vận hành hệ thống						
Bảo trì hệ thống						
Nâng cấp hệ thống						
Total	\$480.00	\$1,440.00	\$1,840.00	\$4,080.00	\$4,160.00	

* Báo cáo sử dụng tài nguyên dự án

					W	ho Does W	hat as of Sat 12 Project1	/10/22	
ID	Indic	ators Resource Name		Work					
1		Nguyen Minh Hien		8	528 hrs				
	ID	Task Name	Units	Work	Delay	Start	Finish		
	4		100%	32 hrs	0 days			•	
	12	Phân tích bằng dữ liệu	100%	32 hrs	0 days				
	16 22	Thiết kế cơ sở dữ liệu Hiện thực phần giao diện frontend	100%	80 hrs 240 hrs	0 days	Fri 10/21/:			
	27	Sứa lỗi	100%	32 hrs	0 days	Fri 1/6/	23 Wed 1/11/23		
	32	Bảo trì hệ thống	100%	80 hrs	0 days				
	3	Khảo sát các nghiệp vụ	100%		0 days		22 Tue 10/4/22		
2		Vu Huy Hoang			152 hrs				
	ID.	Task Name	Units	Work	Delay	Start	Finish		
	- 6	Khảo sát giao diện cơ bản của hệ thống		32 hrs				•	
		Thiết kế tổng thể	100%						
		Xây dựng server Cài đặt hệ thống	100%		O days		/22 Tue 11/22/22 /23 Wed 1/18/23		
1.6	29	Company of the Compan	100%				723 Wed 1/18/23		
3		Nguyen Minh Phu			504 hrs				
		Task Name			Units	Work Dela	y Start	Finish	
	5	Khảo sát các ràng buộc của hệ thống	11 11		100%	8 hrs 0 da		Wed 10/5/22	
	10	Đảm bảo tốc độ xử lý và nâng cấp trong Thiết kế các chức năng đảm bảo tính loạ				16 hrs 0 da 160 hrs 0 da		Tue 10/18/22 Tue 11/15/22	
		Hiện thực phần backend	gc cho ne			240 hrs 0 da		Tue 12/27/22	
		Nâng cấp hệ thống			100%	80 hrs 0 da		Wed 2/1/23	
4		Hoàng Văn Nghĩa			288 hrs				
	ID	Task Name			Units	Work De	lav Start	Finish	
	11	Phân tích và đặt tả mô hình phân cấp ch	ức năng ti	ống thể	100%		avs Tue 10/11/22		
	17	Thiết kế giao diện người dùng			100%	144 hrs 0 d	ays Mon 10/17/22	Mon 11/28/22	
	25	Thiết kế các test scenario, các testcase			100%		ays Wed 12/28/22		
	31	Sửa lỗi khi vận hành hệ thống			100%	72 hrs 0 d	ays Thu 1/19/23	Tue 1/31/23	
5		Đỗ Thiện Hoàng			152 hrs				
	ID	Task Name	Units	Work	Delay	Start	Finish		
	9	Các chức năng chính-phụ	100%	32 hrs	0 days	Mon 10/17/2			
	20	Hiện thực cơ số dữ liệu	100%	80 hrs	O days		2 Thu 11/17/22		
		Thực hiện kiểm thứ Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng	100%	16 hrs 24 hrs	O days O days	Wed 1/4/2	3 Thu 1/5/23 3 Mon 1/23/23		
	30	Dao tao ya mbong dan ngiron sir dung	20076	24 1113	o odys	md 1/19/2	3 MOII 1/23/23		
							Page 1		

^{*} Báo cáo công việc dự án

Unstarted Tasks as of Sat 12/10/22 Project1

	Indic	ators Task N	ame			Duration	1	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
25		Thiết k	ế các te	st scena	rio, các t	es 5 days		Wed 12/28/22	Tue 1/3/23	19	Hoàng Văn Nghĩa
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	4	Hoàng Văn Nghĩa	100%	40 hrs	0 days	Wed 12/28/22	Tue 1/3/23				
26		Thực h	iện kiển	thử		2 days		Wed 1/4/23	Thu 1/5/23	25	Đỗ Thiện Hoàng
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	5	Đỗ Thiện Hoàng	100%	16 hrs	0 days	Wed 1/4/23	Thu 1/5/23				
27		Sửa lỗi				4 days		Fri 1/6/23	Wed 1/11/23	26	Nguyen Minh Hien
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	1	Nguyen Minh Hier	100%	32 hrs	0 days	Fri 1/6/23	Wed 1/11/23				
29		Cài đặt	hệ thối	ng		5 days		Thu 1/12/23	Wed 1/18/23	24	Vu Huy Hoang
	ID.	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	2	Vu Huy Hoang	100%	40 hrs	0 days	Thu 1/12/23	Wed 1/18/23				
30		Đào tại	o và hư	ớng dẫn	người sử	rc 3 days		Thu 1/19/23	Mon 1/23/23	29	Đỗ Thiện Hoàng
	ID.	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	5	Đỗ Thiên Hoàng	100%	24 hrs	0 days	Thu 1/19/23	Mon 1/23/23				
31		Sửa lỗi	khi vận	hành hệ	thống	9 days		Thu 1/19/23	Tue 1/31/23	29	Hoàng Văn Nghĩa
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	4	Hoàng Văn Nghĩa	100%	72 hrs	0 days	Thu 1/19/23	Tue 1/31/23				
32		Bảo trì	hệ thốn	ng		10 days		Thu 1/19/23	Wed 2/1/23	29	Nguyen Minh Hien
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	1	Nguyen Minh Hier	100%	80 hrs	0 days	Thu 1/19/23	Wed 2/1/23	_			
33		Nâng c	ấp hệ th	nống		10 days		Thu 1/19/23	Wed 2/1/23	29	Nguyen Minh Phu
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	3	Nguyen Minh Phu	100%	80 hrs	0 days	Thu 1/19/23	Wed 2/1/23				

Page 1


Tasks In Progress as of Sat 12/10/22 Project1

D	Indic	ators Task Na	me			Duration		Start	Finish	Predecessors	Resource Names
October 2022											
17		Thiết kế	giao di	ện người	dùng	18 days		Mon 10/17/22	Mon 11/28/22	6	Hoàng Văn Nghĩa
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	4	Hoàng Văn Nghĩa	100%	144 hrs	0 days	Mon 10/17/22	Mon 11/28/	22			
Vovember 202	2										
17		Thiết kế	giao di	ện người	dùng	18 days		Mon 10/17/22	Mon 11/28/22	6	Hoàng Văn Nghĩa
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	4	Hoàng Văn Nghĩa	100%	144 hrs	0 days	Mon 10/17/22	Mon 11/28/	22			
22		Hiện thị	rc phần	giao diệr	fronten	30 days		Fri 11/4/22	Thu 12/15/22	17	Nguyen Minh Hien
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	1	Nguyen Minh Hien	100%	240 hrs	0 days	Fri 11/4/22	Thu 12/15/22	7			
23		Hiện thị	rc phần	backend		30 days		Wed 11/16/22	Tue 12/27/22	16,18	Nguyen Minh Phu
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	3	Nguyen Minh Phu	100%	240 hrs	0 days	Wed 11/16/22	Tue 12/27/2	22			
December 202	2										
22		Hiện thụ	rc phần	giao diệr	fronten	30 days		Fri 11/4/22	Thu 12/15/22	17	Nguyen Minh Hien
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	1	Nguyen Minh Hien	100%	240 hrs	0 days	Fri 11/4/22	Thu 12/15/22	7			
23		Hiện thụ	rc phần	backend		30 days		Wed 11/16/22	Tue 12/27/22	16,18	Nguyen Minh Phu
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish				
	3	Nguyen Minh Phu	100%	240 hrs	0 days	Wed 11/16/22	Tue 12/27/2	22			


Completed Tasks as of Sat 12/10/22 Project1									
ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	% Comp.	Cost		
September 2022		Total and the same							
3	Auto Schedu	Khảo sát các nghiệp vụ	4 days	Thu 9/29/22	Tue 10/4/22	100%	\$960.00		
October 2022	Auto Schedu	Khảo sát các nghiệp vụ	4 days	Th., 0/20/22	T 10/4/22	100%	\$960.00		
4	Auto Schedu	Khảo sát các chức năng của hệ th	4 days	Thu 9/29/22 Wed 10/5/22	Tue 10/4/22 Mon 10/10/22	100%	\$960.00		
5	Auto Schedu	Khảo sát các ràng buộc của hệ th	1 day	Wed 10/5/22 Wed 10/5/22	Wed 10/5/22	100%	\$240.00		
6	Auto Schedu	Khảo sát giao diên cơ bản của hệ	4 days	Tue 10/11/22	Fri 10/14/22	100%	\$960.00		
11	Auto Schedu	Phân tích và đặt tả mô hình phân	4 days	Tue 10/11/22	Fri 10/14/22	100%	\$640.00		
9	Auto Schedu	Các chức năng chính-phụ	4 days	Mon 10/17/22	Thu 10/20/22	100%	\$640.00		
10	Auto Schedu	Đảm bảo tốc đô xử lý và nâng cấi	2 days	Mon 10/17/22	Tue 10/18/22	100%	\$480.00		
12	Auto Schedu	Phân tích bằng dữ liệu	4 days	Mon 10/17/22	Thu 10/20/22	100%	\$960.00		
18	Auto Schedu	Thiết kế các chức năng đảm bảo 1	20 days	Wed 10/19/22	Tue 11/15/22	100%	\$4,800.00		
14	Auto Schedu	Thiết kế tổng thể	5 days	Fri 10/21/22	Thu 10/27/22	100%	\$1,200.00		
16	Auto Schedu	Thiết kế cơ sở dữ liệu	10 days	Fri 10/21/22	Thu 11/3/22	100%	\$2,400.00		
November 2022									
18	Auto Schedu	Thiết kể các chức năng đảm bảo t	20 days	Wed 10/19/22	Tue 11/15/22	100%	\$4,800.00		
16	Auto Schedu	Thiết kế cơ sở dữ liêu	10 days	Fri 10/21/22	Thu 11/3/22	100%	\$2,400.00		
20	Auto Schedu	Hiện thực cơ sở dữ liệu	10 days	Fri 11/4/22	Thu 11/17/22	100%	\$1,600.00		
21	Auto Schedu	Xây dựng server	5 days	Wed 11/16/22	Tue 11/22/22	100%	\$1,200.00		
				Page 1					

Câu 2: Thực hiện cách in và lưu trữ biểu mẫu báo cáo dưới các định dạng khác nhau

- Tiến hành lưu file với các định dạng khác nhau: vào **Save as** sau đó chọn loại tệp muốn lưu và bấm **Save**

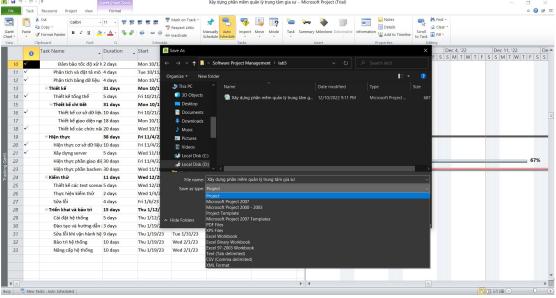

- Lưu dưới định dạng pdf

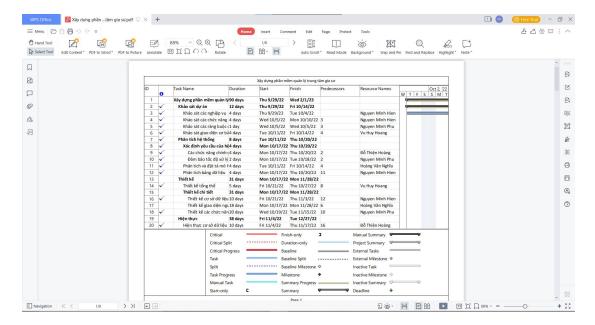

- Lưu dưới định dạng excel

